


Projekt: KB_DMS_KB_ProjectPlan_20 Datum: 11.4.16	Úkol		Souhrn projektu		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Průběh	
	Rozdělení		Vnější úkoly		Inactive Summary		Manual Summary		Konečný termín	
	Milník		Vnější milník		Manual Task		Start-only			
	Souhrnný		Inactive Task		Duration-only		Finish-only			

ID	Task Name	Doba trvání																	
			12.30.	14.V.14.	11.VI.28.	9.VII.25.	6.VIII.23.	3.IX.20.	1.X.17.	29.X.15.	26.XI.12.	24.XII.10.	21.I.7.	18.II.4.	18.III.1.	15.IV.29.	13.V.27.	10.VI.24.	8.VII.8.
55	Change management - Roll-out - příprava	0 dny																	
56	Change management - Roll-out - finalizace 1	0 dny																	
57	Change management - Roll-out - finalizace 2	0 dny																	
58	3rd parties management - Outsourcing (Océ, IM, CP, GC)	0 dny																	
59	Document catalogue - podklady k doplnění	0 dny																	
60	Document catalogue - finalizace	0 dny																	
61	TSS, WMT, Bagman, C4M, Debety, šablony, ROK-P, MRT,... - referenční procesy	0 dny																	
62	TSS, WMT, Bagman, C4M, Debety, šablony, ROK-P, MRT,... - other active	0 dny																	
63	TSS, WMT, Bagman, C4M, Debety, šablony, ROK-P, MRT,... - other pasive	0 dny																	
64	Předání vstupů pro tvorbu BI solution	0 dny																	
65	Připraven vstup BI do SD dokumentu	0 dny																	
66	DMS Core independent	170,5 dny?																	
67	Governance - TBD	1 den?																	
68	Training - přípravné práce	0 dny																	
69	Training - aktualizace pro SD 0.1	0 dny																	
70	Training - finalizace	0 dny																	
71	Internal rules - přípravné práce	0 dny																	
72	Internal rules - finalizace	0 dny																	
73	Business case - presentation	0 dny																	
74	Business case - finalizace	0 dny																	
75	Gradual implementation, potentials for integration reduction - draft	0 dny																	
76	Gradual implementation, potentials for integration reduction - final	1 den?																	
77	Validace	21 dny																	
78	Final Draft SD to KB core team submitted for review	0 dny																	
79	Final Draft SD document submitted	0 dny																	
80	5310	1 den?																	
81	5320	177,5 dny																	
82	DMS Core	116,5 dny																	
83	Infrastruktura DMS	116,5 dny																	
84	Technická infrastruktura	116,5 dny																	
85	Milestone - Draft architektury včetně sizingu Díla pro prod. prostředí	0 dny																	
86	Milestone - Revize draftu architektury včetně sizingu Díla pro všechna prostředí vč. app, integ., infra - referenční produkty (SD 0.11)	0 dny																	
87	Milestone - Revize draftu architektury včetně sizingu Díla pro všechna prostředí vč. app, integ., infra (SD0.31)	0 dny																	
88	Operations	48 dny																	
89	Milestone - Revize governance, OPERATION (i SLA) pro všechna prostředí (SD0.11)	0 dny																	
90	Milestone - Revize governance, OPERATION (i SLA) pro všechna prostředí (SD0.31)	0 dny																	
91	Infrastruktura jiných aplikací (TSS, WMT, Debety, Bagman, C4M, šablony)	52 dny																	
92	Technická infrastruktura	52 dny																	
93	Milestone - Revize draftu architektury včetně sizingu Díla pro všechna prostředí vč. app, integ., infra (SD0.11)	0 dny																	
94	Milestone - Revize draftu architektury včetně sizingu Díla pro všechna prostředí vč. app, integ., infra (SD0.31)	0 dny																	
95	Milestone - Revize draftu architektury včetně sizingu Díla pro všechna prostředí vč. app, integ., infra (SD0.31)	0 dny																	
96	Operations	48 dny																	
97	Milestone - Revize governance, OPERATION (i SLA) pro všechna prostředí (SD0.11)	0 dny																	
98	Milestone - Revize governance, OPERATION (i SLA) pro všechna prostředí (SD0.31)	0 dny																	
99	Infrastruktura KB služeb a vybavení (ESB, B2B, Citrix, WAN, LCD, skenery, ...)	55 dny																	
100	Technická infrastruktura	55 dny																	
101	Milestone - Revize draftu architektury včetně sizingu Díla pro všechna prostředí vč. app, integ., infra (SD0.11)	0 dny																	
102	Milestone - Revize draftu architektury včetně sizingu Díla pro všechna prostředí vč. app, integ., infra (SD0.31)	0 dny																	
103	Operations	48 dny																	
104	Milestone - Revize governance, OPERATION (i SLA) pro všechna prostředí (SD0.11)	0 dny																	

Projekt: KB_DMS_KB_ProjectPlan_20 Datum: 11.4. 16	Úkol		Souhrn projektu		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Průběh	
	Rozdělení		Vnější úkoly		Inactive Summary		Manual Summary		Konečný termín	
	Milník		Vnější milník		Manual Task		Start-only			
	Souhrnný		Inactive Task		Duration-only		Finish-only			

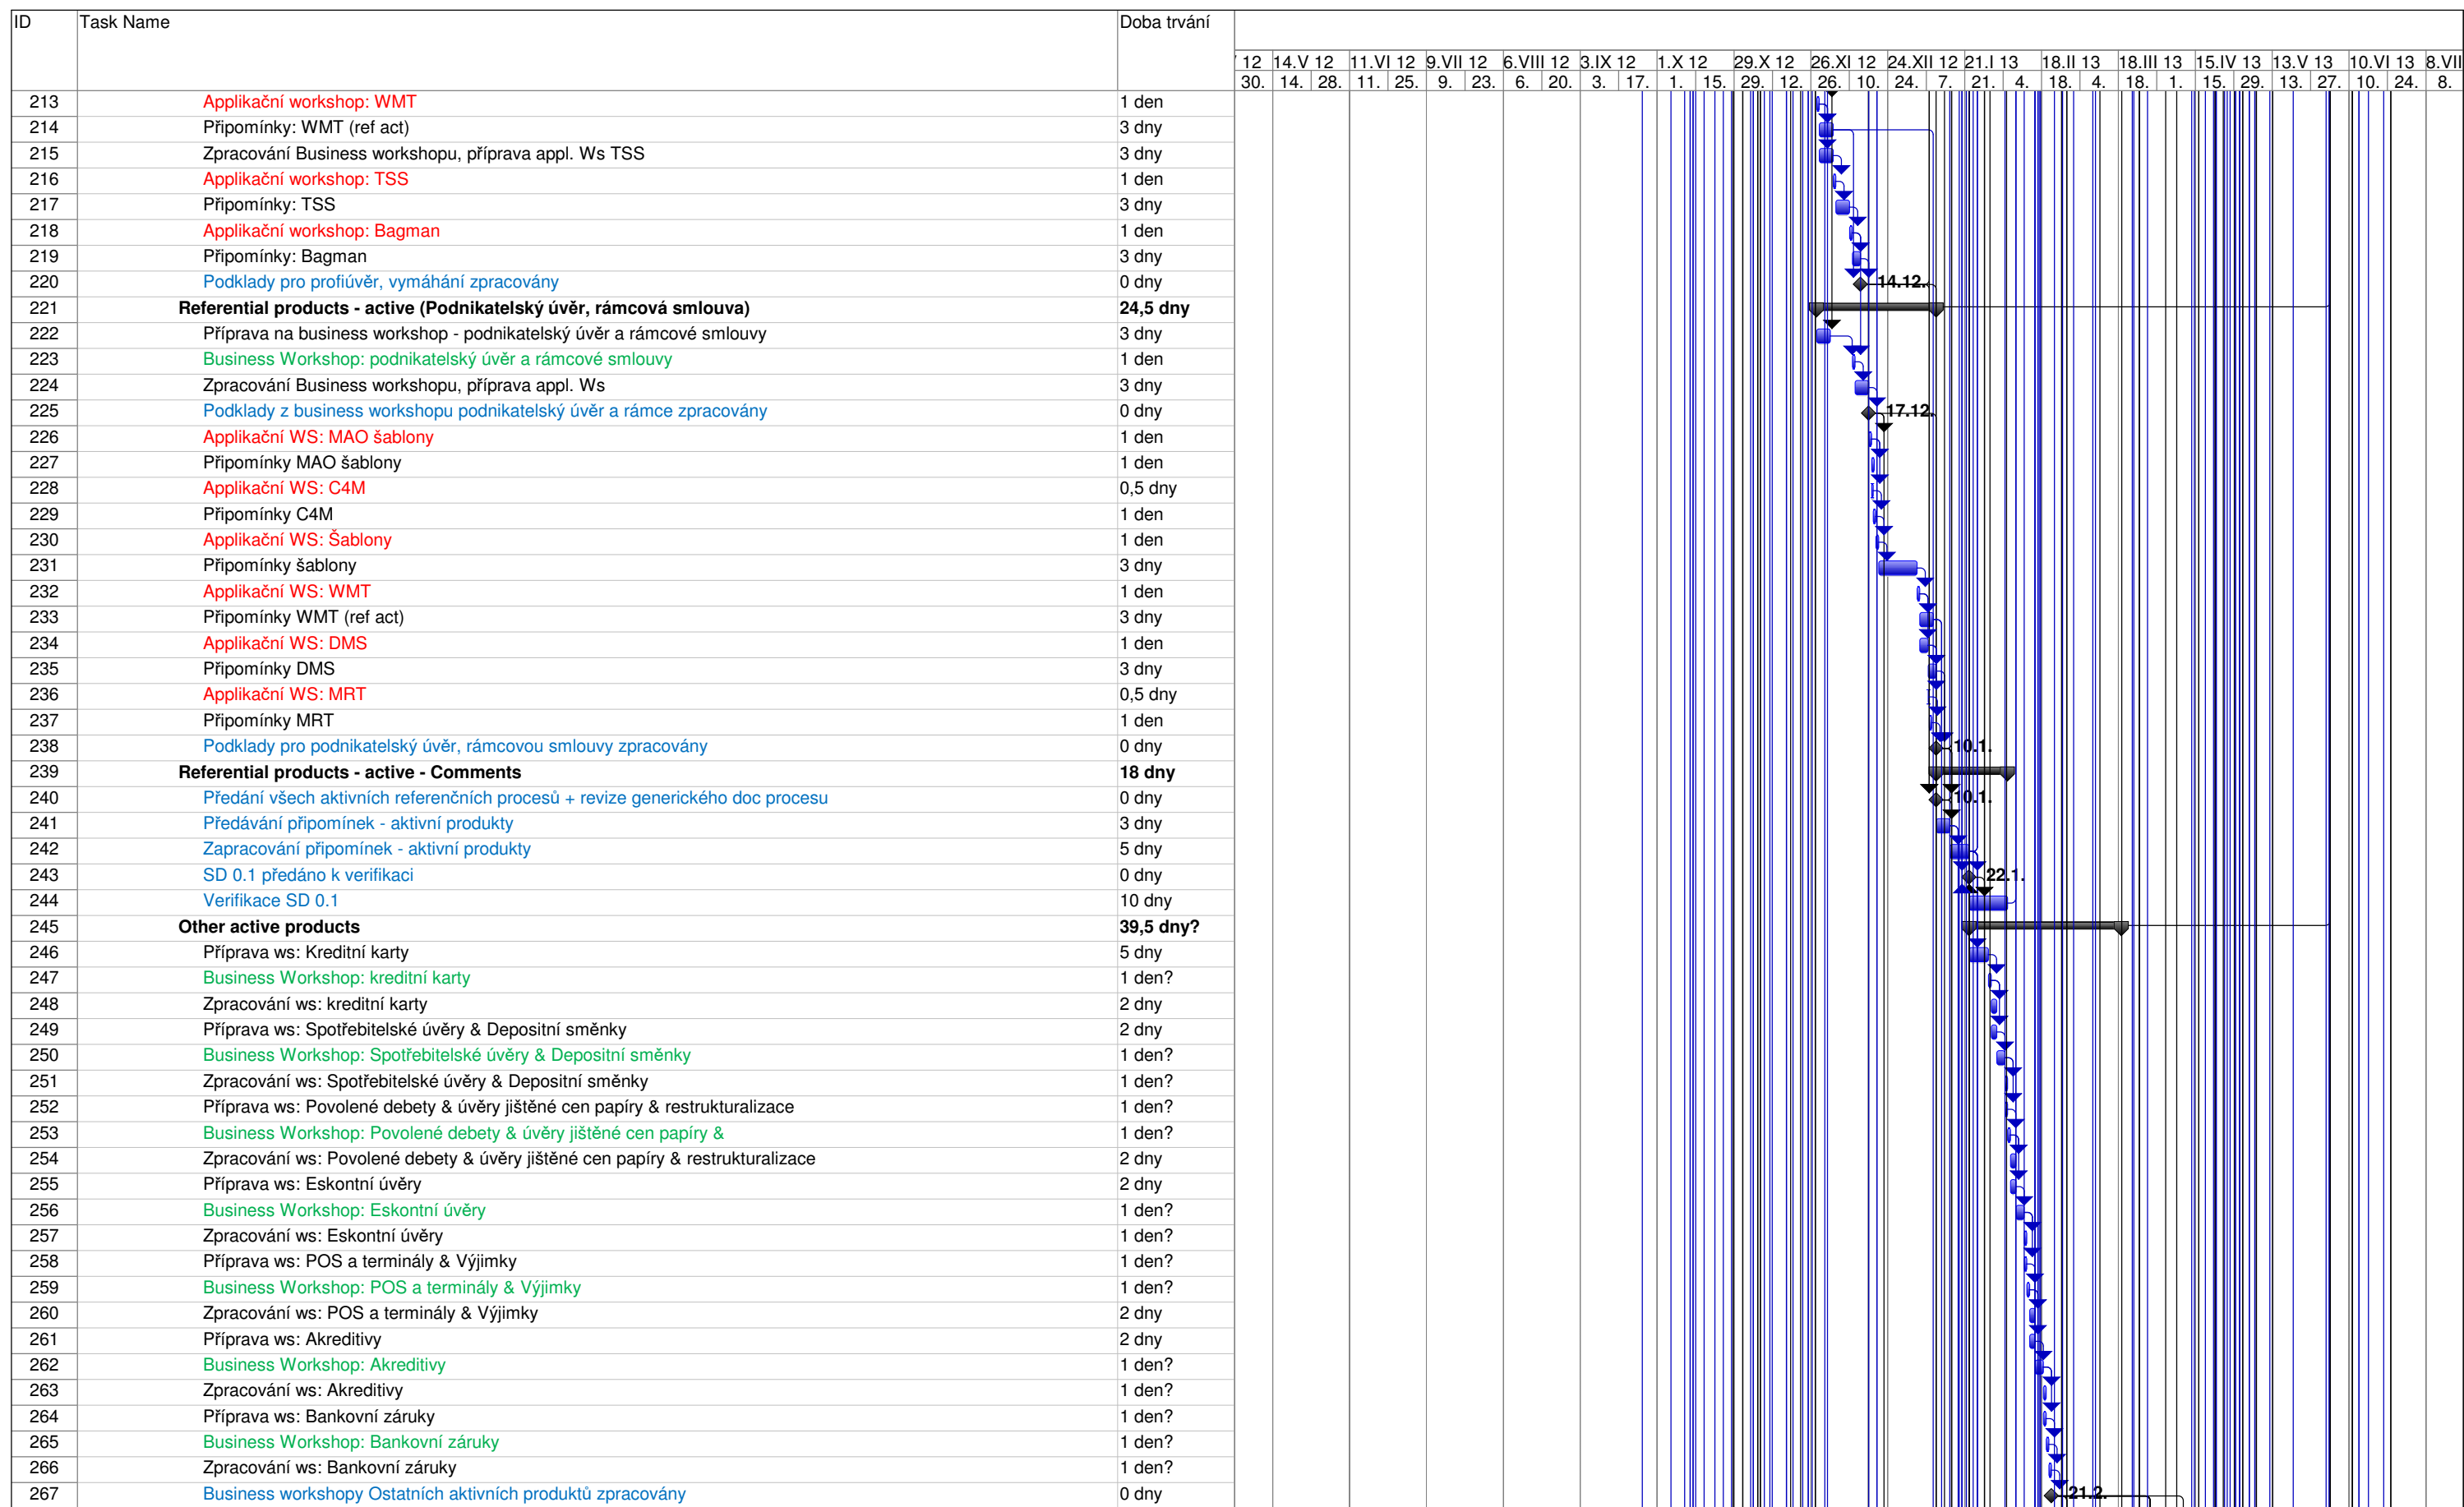


Projekt: KB_DMS_KB_ProjectPlan_20 Datum: 11.4. 16	Úkol		Souhrn projektu		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Průběh	
	Rozdělení		Vnější úkoly		Inactive Summary		Manual Summary		Konečný termín	
	Milník		Vnější milník		Manual Task		Start-only			
	Souhrnný		Inactive Task		Duration-only		Finish-only			

ID	Task Name	Doba trvání																	
			12.30.	14.V.14.	11.VI.12.	9.VII.12.	6.VIII.12.	3.IX.12.	1.X.12.	29.X.12.	26.XI.12.	24.XII.12.	21.I.13.	18.II.13.	18.III.13.	15.IV.13.	13.V.13.	10.VI.13.	8.VII.13.
268	Applikační workshop: Bagman + šablony	1 den																	
269	Připomínky: Bagman + šablony	2 dny																	
270	Applikační workshop: C4M	0,5 dny																	
271	Připomínky: C4M	1 den																	
272	Příprava: WMT (ost. akt.)	3 dny																	
273	Applikační workshop: WMT (ost. akt.)	1 den?																	
274	Připomínky: WMT (ost. akt.)	3 dny																	
275	Příprava: TSS (ost. akt.)	4 dny																	
276	Applikační workshop: TSS3	1 den?																	
277	Připomínky: TSS3	3 dny																	
278	Applikační WS: DMS Fce a DMS migrace Fce	1 den?																	
279	Připomínky DMS Fce a DMS migrace Fce	3 dny																	
280	Podklady pro zpracování ostatních aktivních produktů zpracovány	0 dny																	
281	Other active products - Comments	19 dny?																	
282	Předání všech aktivních ostatních procesů + revize generického doc procesu	0 dny																	
283	Předávání připomínek - ostatní aktivní produkty	3 dny																	
284	Zpracování připomínek - ostatní aktivní produkty	5 dny																	
285	SD 0.2 předáno k validaci	1 den?																	
286	Validace SD 0.2	10 dny																	
287	Other passive products	26 dny?																	
288	Příprava ws: Obchody na fin trzích & šeky	2 dny																	
289	Business Workshop: obchody na fin.trzích & šeky	1 den?																	
290	Zpracování ws: obchody na fin.trzích & šeky	1 den?																	
291	Příprava ws: Cenné papíry	1 den?																	
292	Business Workshop: Cenné papíry	1 den?																	
293	Zpracování ws: Cenné papíry	1 den?																	
294	Příprava ws: Platební karty	1 den?																	
295	Business Workshop: Platební karty	1 den?																	
296	Zpracování ws: Platební karty	2 dny																	
297	Příprava ws: Přímé a tel bankovníctví	2 dny																	
298	Business Workshop: Přímé a tel bankovníctví	1 den?																	
299	Zpracování ws: Přímé a tel bankovníctví	1 den?																	
300	Příprava ws: Dohoda o správě kupní ceny	2 dny																	
301	Business Workshop: Dohoda o správě kupní ceny	1 den																	
302	Zpracování ws: Dohoda o správě kupní ceny	2 dny																	
303	Příprava ws: Služby k depozitům & dceřinné spol a produkty 3. stran	2 dny																	
304	Business Workshop: Služby k depozitům & dceřinné spol a produkty 3. stran	1 den?																	
305	Zpracování ws: Služby k depozitům & dceřinné spol a produkty 3. stran	1 den?																	
306	Business workshopy ostatních pasivních produktů zpracovány	0 dny																	
307	Applikační workshop: ROK-P + šablony	1 den																	
308	Připomínky: ROK-P + šablony	2 dny																	
309	Příprava na aplikační workshop WMT	3 dny																	
310	Applikační workshop: WMT	1 den?																	
311	Připomínky: WMT (ost. pas.)	3 dny																	
312	Příprava na aplikační workshop TSS3	4 dny																	
313	Applikační workshop: TSS3	1 den?																	
314	Připomínky: TSS3 (ost pas)	3 dny																	
315	Applikační WS: DMS Fce a DMS migrace Fce	1 den?																	
316	Připomínky DMS Fce a DMS migrace Fce	3 dny																	
317	Podklady pro zpracování ostatních pasivních produktů zpracovány	0 dny																	
318	Other passive products - Comments	18 dny																	
319	Předání všech pasivních ostatních procesů + revize generického doc procesu	0 dny																	
320	Předávání připomínek - ostatní pasivní produkty	3 dny																	
321	Zpracování připomínek - ostatní pasivní produkty	5 dny																	
322	SD 0.3 předáno k validaci	0 dny																	

Projekt: KB_DMS_KB_ProjectPlan_20 Datum: 11.4. 16	Úkol		Souhrn projektu		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Průběh	
	Rozdělení		Vnější úkoly		Inactive Summary		Manual Summary		Konečný termín	
	Milník		Vnější milník		Manual Task		Start-only			
	Souhrnný		Inactive Task		Duration-only		Finish-only			

ID	Task Name	Doba trvání																		
			12.30.	14.V.14.	28.11.	11.VI.25.	9.VII.23.	6.VIII.20.	3.IX.17.	1.X.15.	29.X.12.	26.XI.10.	24.XII.7.	21.I.4.	18.II.4.	18.III.1.	15.IV.15.	13.V.13.	10.VI.27.	8.VII.24.
323	SD 0.3 validace	10 dny																		
324	Documents tracking (record, transport, archive, ...)	105 dny?																		
325	Příprava business ws: procesy archivace a skartace - pasivní produkty	1 den?																		
326	Business workshop: archivace skartace, pasivní produkty	1 den?																		
327	Zpracování Business workshopu archivace, skartace	2 dny																		
328	Aplikační ws: DTP	1 den?																		
329	Připomínky: DTP	1 den?																		
330	Aplikační workshop: DMS migrované funkcionality (EPRDOK, ESCUDO, EVIBAL, ...)	1 den																		
331	Připomínky: DMS migrované funkcionality (EPRDOK, ESCUDO, EVIBAL, ...)	1 den																		
332	Aplikační workshop: Eklid	1 den?																		
333	Připomínky: Eklid	1 den?																		
334	Podklady pro evidenci a sledování dokumentů připraveny pro pasivní procesy	0 dny																		
335	Příprava business ws: procesy archivace a skartace - aktivní produkty	1 den?																		
336	Business workshop: archivace skartace aktivní produkty	1 den?																		
337	Zpracování Business workshopu archivace, skartace	2 dny																		
338	Aplikační ws: DTP	1 den?																		
339	Připomínky: DTP	1 den?																		
340	Aplikační workshop: DMS migrované funkcionality (EPRDOK, ESCUDO, EVIBAL, ...)	1 den?																		
341	Připomínky: DMS migrované funkcionality (EPRDOK, ESCUDO, EVIBAL, ...)	1 den?																		
342	Aplikační workshop: Eklid	1 den?																		
343	Připomínky: Eklid	1 den?																		
344	Podklady pro evidenci a sledování dokumentů připraveny pro aktivní procesy	0 dny																		
345	Business workshop: archivace skartace - aktualizace	0,5 dny																		
346	Aplikační WS: DTP & DMS migrované funkcionality	0,5 dny																		
347	Připomínky DTP & DMS migrované funkcionality	1 den																		
348	Podklady pro evidenci a sledování dokumentů připraveny - aktualizace	0 dny																		
349	Business Rules Engine	56,5 dny?																		
350	Příprava business ws: BRE - pasivní produkty	1 den?																		
351	Business workshop: DMS BRE - pasivní produkty	1 den?																		
352	Zpracování Business workshopu DMS BRE - pasivní produkty	1 den?																		
353	Aplikační ws: DMS - pasivní produkty	1 den?																		
354	Připomínky: DMS - pasivní produkty	5 dny																		
355	Zpracování připomínek BRE	5 dny																		
356	Zpracovány podklady pro BRE - pasivní produkty	0 dny																		
357	Příprava business ws: BRE - aktivní produkty	1 den?																		
358	Business workshop: DMS BRE - aktivní produkty	1 den?																		
359	Zpracování Business workshopu DMS BRE - aktivní produkty	1 den?																		
360	Aplikační ws: DMS - aktivní produkty	1 den?																		
361	Připomínky: DMS - aktivní produkty	5 dny																		
362	Zpracování připomínek BRE	5 dny																		
363	Zpracovány podklady pro BRE - aktivní produkty	0 dny																		
364	Security	53,5 dny?																		
365	Příprava appl ws: Security - pasivní produkty	10 dny																		
366	Business ws: Security - pasivní produkty	1 den																		
367	Připomínky: Security - pasivní produkty	3 dny																		
368	Příprava architekt ws: Security - architektura	1 den?																		
369	Architekt ws: Security - architektura (pasivní prod)	1 den?																		
370	Připomínky Security - architektura (pasivní prod)	3 dny																		
371	Zpracovány podklady pro security pasivních produktů	0 dny																		
372	Příprava appl ws: Security - aktivní produkty	10 dny																		
373	Business ws: Security - aktivní produkty	1 den																		
374	Připomínky: Security - aktivní produkty	3 dny																		
375	Příprava architekt ws: Security - architektura	1 den																		
376	Architekt ws: Security - architektura	1 den?																		
377	Připomínky Security - architektura	3 dny																		



Projekt: KB_DMS_KB_ProjectPlan_20 Datum: 11.4.16	Úkol	Souhrn projektu		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Průběh	
	Rozdělení	Vnější úkoly		Inactive Summary		Manual Summary		Konečný termín	
	Milník	Vnější milník		Manual Task		Start-only			
	Souhrnný	Inactive Task		Duration-only		Finish-only			

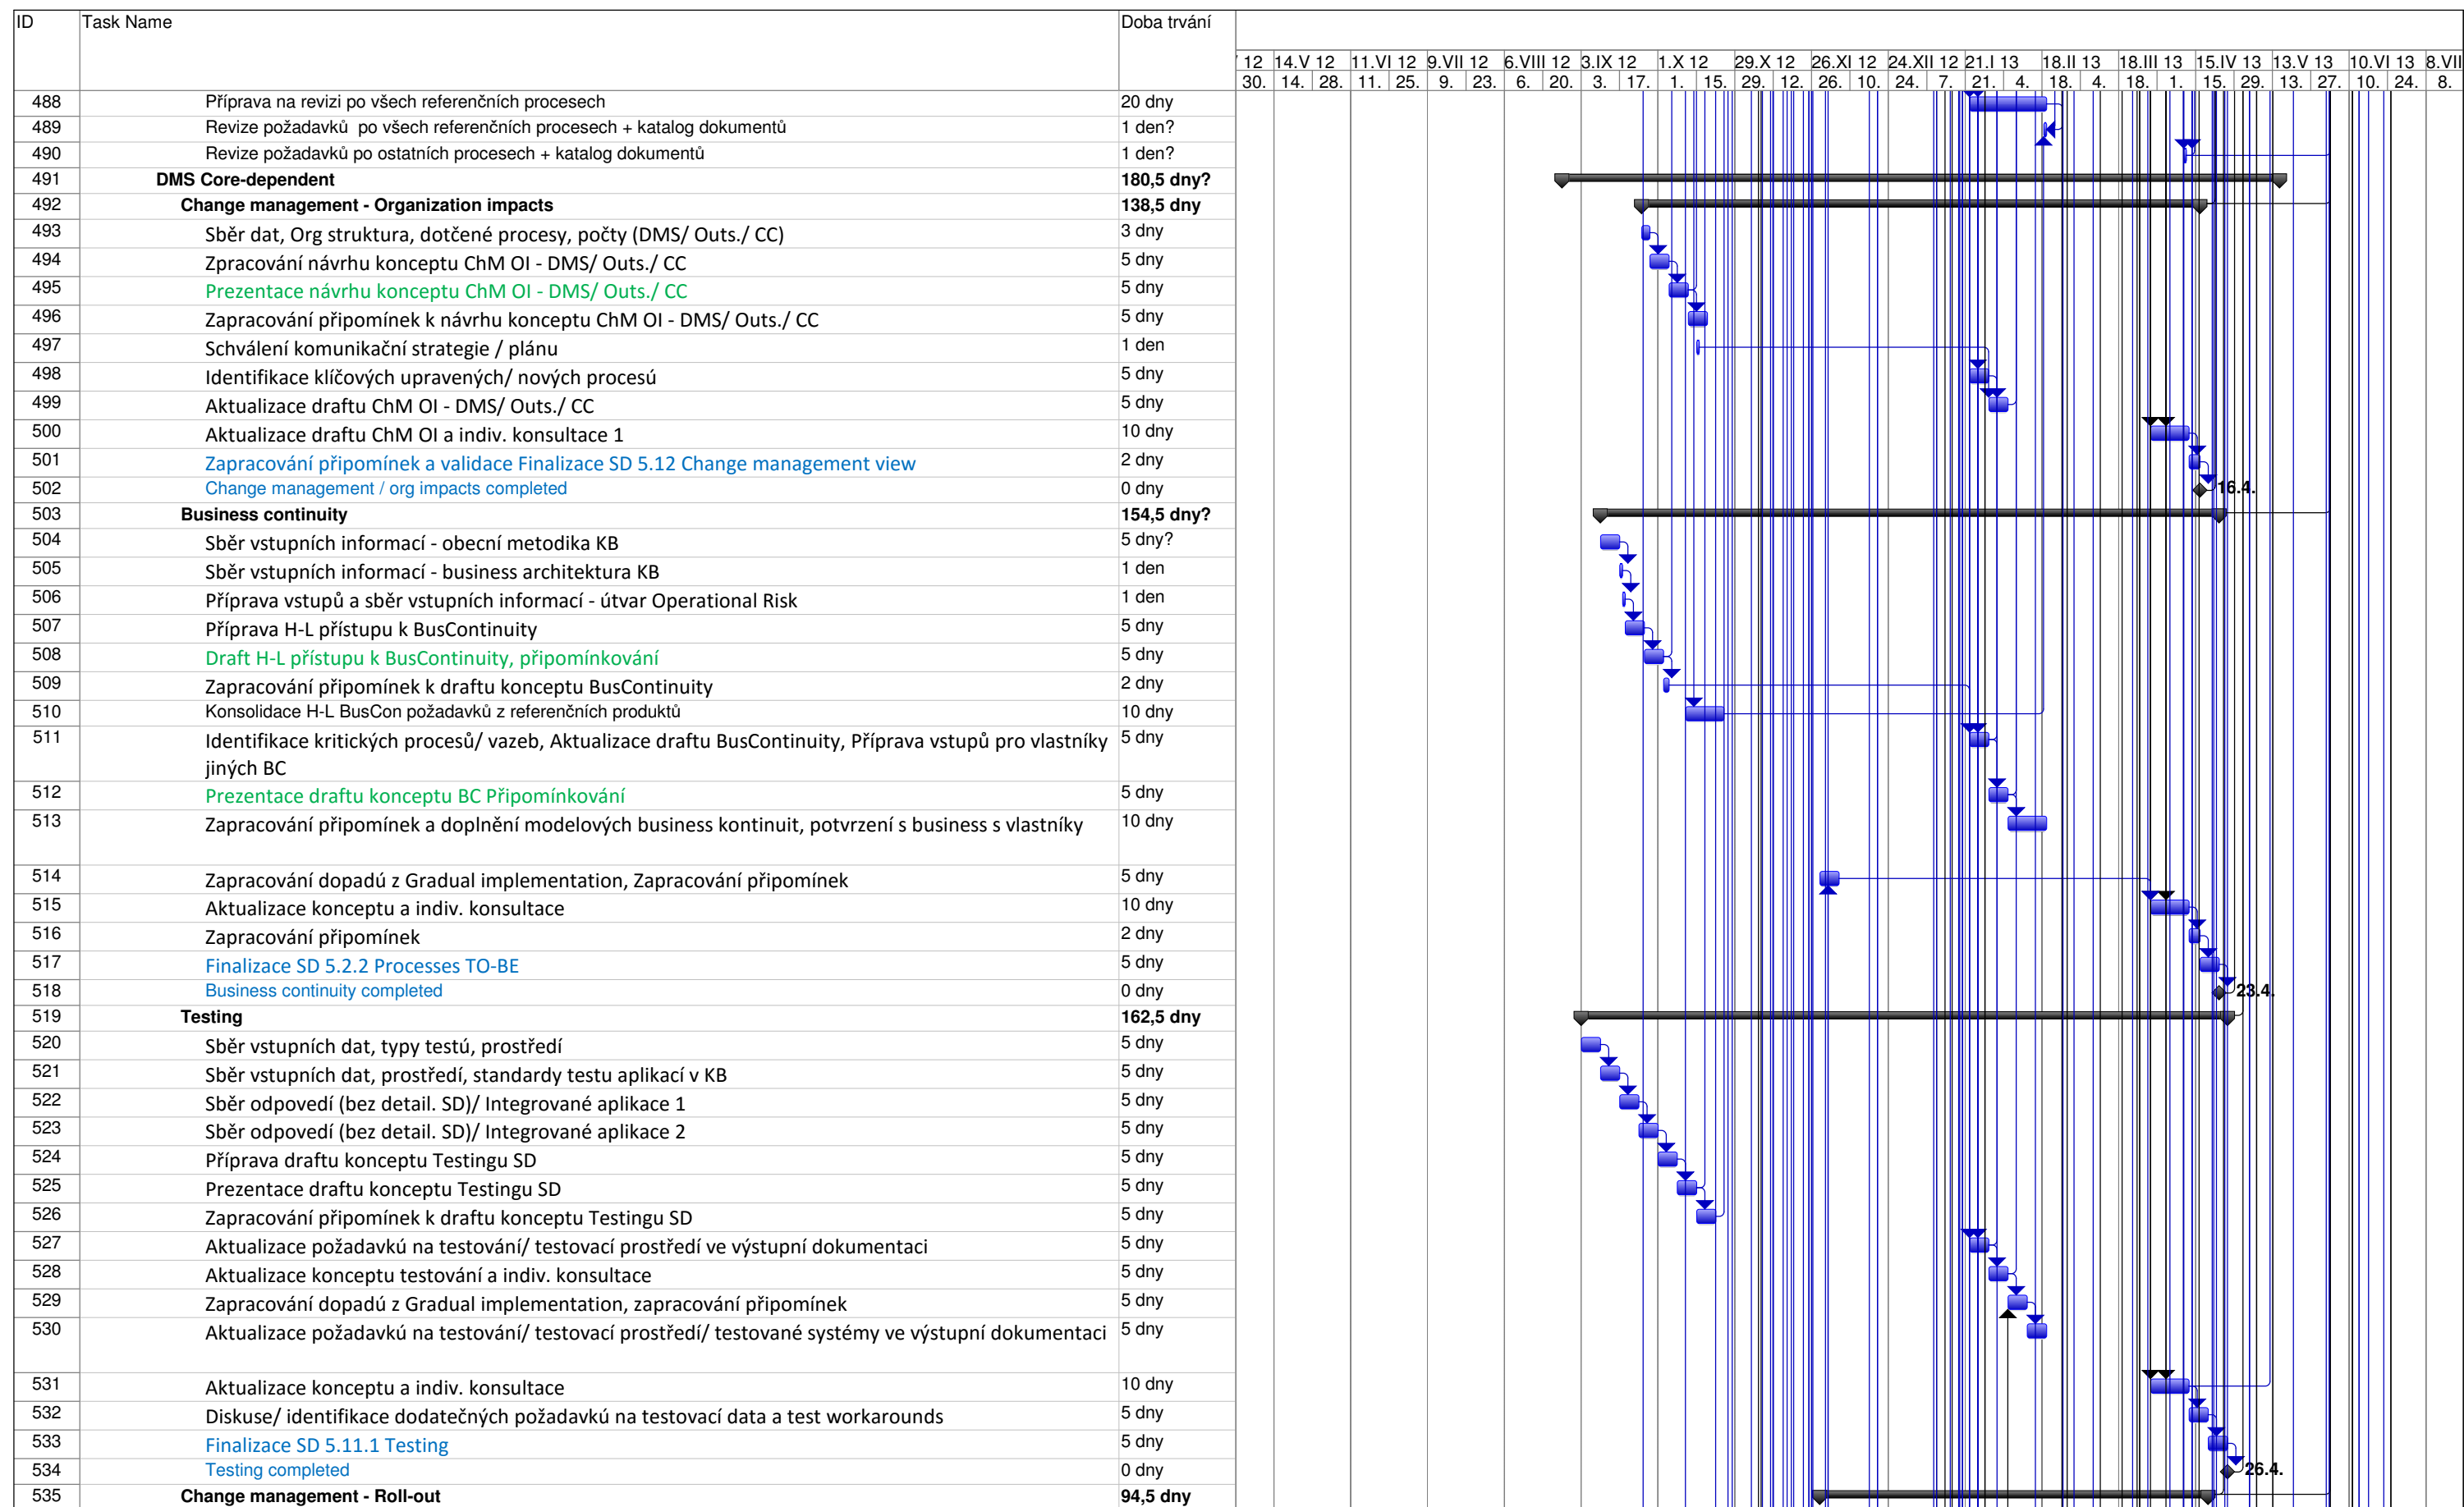

Projekt: KB_DMS_KB_ProjectPlan_20
Datum: 11.4.16

Úkol		Souhrn projektu		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Průběh	
Rozdělení		Vnější úkoly		Inactive Summary		Manual Summary		Konečný termín	
Milník		Vnější milník		Manual Task		Start-only			
Souhrnný		Inactive Task		Duration-only		Finish-only			

ID	Task Name	Doba trvání	12												13		14																				
			12	14.V 12	11.VI 12	9.VII 12	6.VIII 12	3.IX 12	1.X 12	29.X 12	26.XI 12	24.XII 12	21.I 13	18.II 13	18.III 13	15.IV 13	13.V 13	10.VI 13	8.VII																		
			30.	14.	28.	11.	25.	9.	23.	6.	20.	3.	17.	1.	15.	29.	12.	26.	10.	24.	7.	21.	4.	18.	4.	18.	1.	15.	29.	13.	27.	10.	24.	8.			
745	Podklady pro nacenění T1	1 den?																																			
746	Procesní procedura 5320	1 den?																																			
747	Design SD prostředí	1 den?																																			
748	SD Final draft available for Validation	0 dny																																			
749	SD Validation & IMP Approval	31 dny?																																			
750	Final Draft SD to KB core team submitted for review	0 dny																																			
751	Discussion Final Draft SD to KB core team	0 dny																																			
752	Business case/ benefits presentation &validation	10 dny																																			
753	Open points for implementation validation	5 dny																																			
754	Review cycles of SD document	21 dny																																			
755	Validation workshop #1	4 dny																																			
756	Comments #1	4 dny																																			
757	Comments application	4 dny																																			
758	Validation workshop #2	3 dny																																			
759	Comments #2	3 dny																																			
760	Comments application	3 dny																																			
761	Final Draft SD document submitted	0 dny																																			
762	Implementation planning (Time + Deliveries)	11 dny																																			
763	IMP Plan preparation	3 dny																																			
764	IMP Plan workshop	5 dny																																			
765	IMP Plan acceptance	3 dny																																			
766	Architecture introduction	1 den?																																			
767	Architecture Committee #1	1 den																																			
768	Commentaries from Architecture Committee	3 dny																																			
769	Application of commentaries from KB	1 den																																			
770	Architecture Committee #2 / acceptance	1 den																																			
771	RIP	3 dny																																			
772	PSC - final SD approval	3 dny																																			
773	PMC preparation	7 dny																																			
774	PMC approval	3 dny																																			
775	SD phase accepted	0 dny																																			
776																																					
777	SD management	80 dny																																			
778	Projektový management	80 dny																																			
779	Komunikace	80 dny																																			
780	Smluvní jednání	80 dny																																			

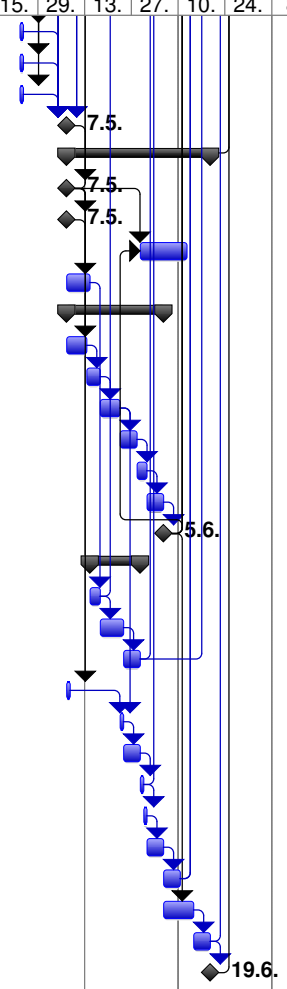

Projekt: KB_DMS_KB_ProjectPlan_20 Datum: 11.4. 16	Úkol		Souhrn projektu		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Průběh	
	Rozdělení		Vnější úkoly		Inactive Summary		Manual Summary		Konečný termín	
	Milník		Vnější milník		Manual Task		Start-only			
	Souhrnný		Inactive Task		Duration-only		Finish-only			
